

(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.19)


令和 8 (2026) 年 1 月末



事業用地内 (赤枠)

- ・工場棟：外壁（塗装）、4階見学者通路（内装軽量下地ボード貼り）、EV1設置工事、北面東面外部足場解体、プラットフォーム部（耐火被覆、屋根トップライト取付）、ごみピット部（屋根 ALC 版取付）、プラント機器（蒸気復水器ヤード機器据付、灰クレーン組立、各所ダクト取付、各所配管工事、各所電気計装工事、各所保温板金塗装工事、焼却炉築炉工事）
- ・管理棟：1階 設備電気配管、2階 サッシ取付 R階 スラブコン打設
- ・資源ごみ処理施設：基礎躯体構築

令和 8 (2026) 年 2 月末

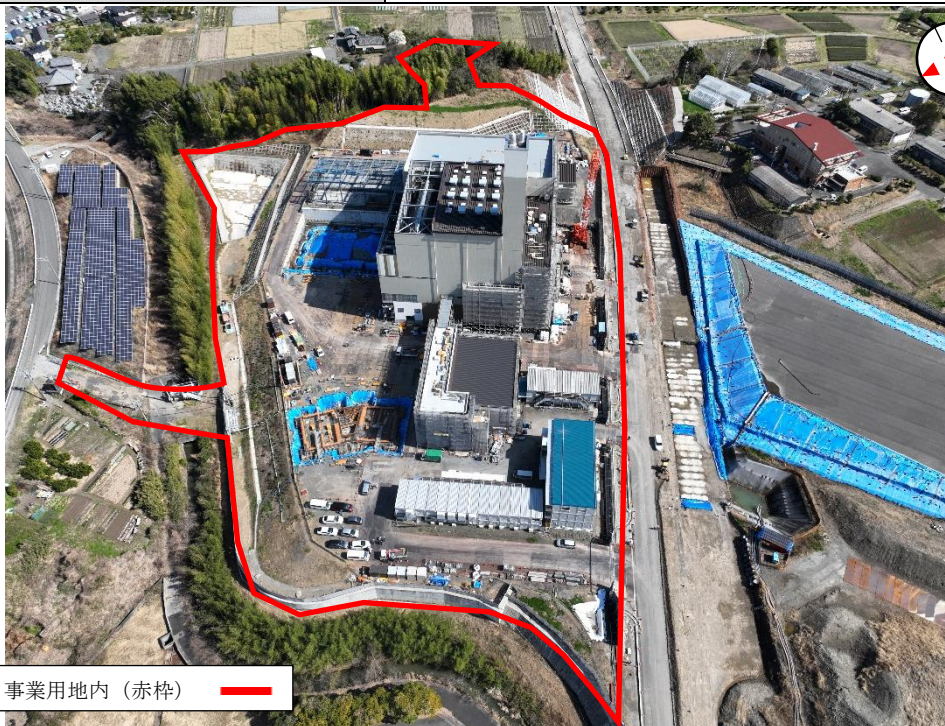

事業用地内 (赤枠)

- ・工場棟：外壁（塗装）、4階見学者通路（内装ボード貼り）、トイレ（床シート張り、トイレブース設置）南面外部足場解体、各所屋上部（防水工事、屋根工事）、東側外構（掘削、集水桝設置）プラント機器（各所ダクト取付、各機器まとめ、歩廊仕舞、各所配管工事、各所電気計装工事、各所保温板金塗装工事、焼却炉築炉工事）
- ・管理棟：1階 設備電気配管、内装工事 サッシ取付 2階断熱ウレタン 外壁塗装
- ・計量棟：基礎躯体構築
- ・資源ごみ処理施設：1階スラブ配筋
- ・市民持込棟：基礎型枠建て込み
