


(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.20)

令和 8 (2026) 年 3 月末



- ・工場棟：外壁（塗装）、4階見学者通路（内装クロス貼り）、トイレ（床シート張り、トイレブース設置）
南側足場解体、各所屋上部（防水工事、屋根工事）、各所外構（掘削、集水桝設置）
プラント機器（計量機据付、各機器まとめ、歩廊仕舞、各所配管工事、各所電気計装工事、
各所保温板金塗装工事、焼却炉築炉工事）
- ・管理棟：1.2階 設備電気配管、内装工事 サッシ取付 3階断熱ウレタン
- ・計量棟：計量機器据付 ・資源ごみ処理施設：外壁ALC取付 ・市民持込棟：鉄骨建方、土間整地

令和 8 (2026) 年 4 月末

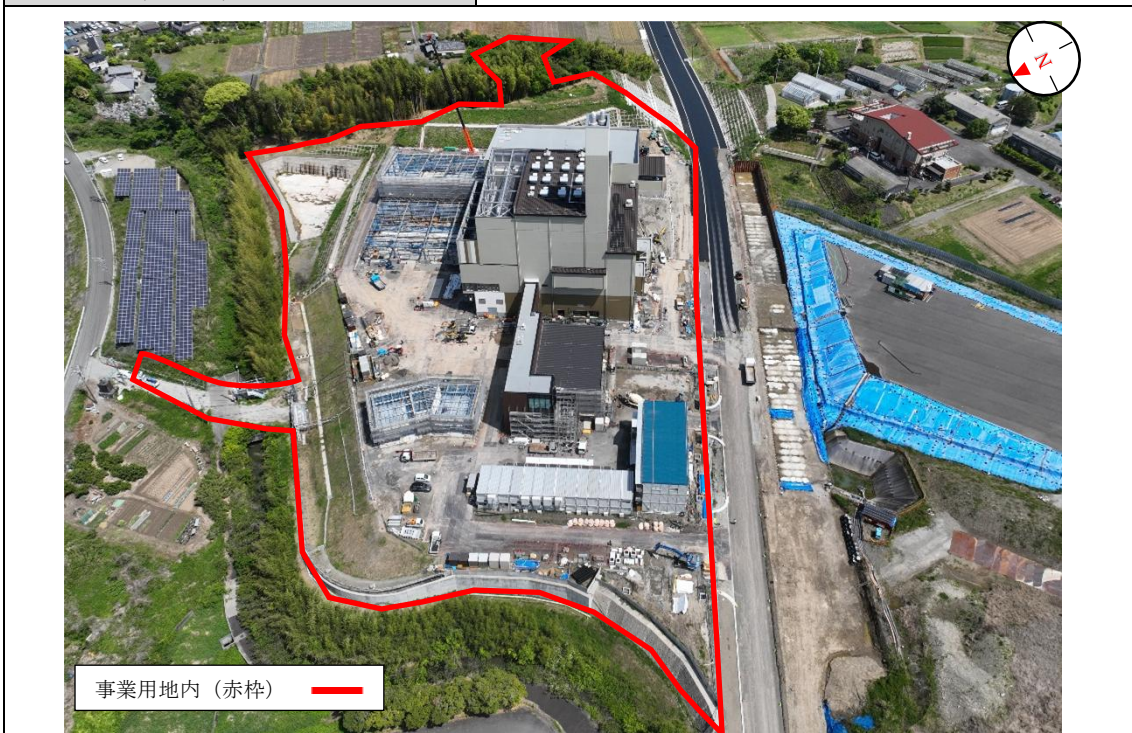

- ・工場棟：外壁（塗装）、4階電気室（床シート貼り）、トイレ（各階衛生器具取付）、炉室内部（耐火被覆、照明取付）
各所屋上部（防水工事、屋根工事）、各所外構（掘削、集水桝設置、埋設配管）
プラント機器（各機器・歩廊まとめ、各所配管工事、各所電気計装工事、各所保温板金塗装工事）
- ・管理棟：1.2階 設備電気配管、内装ボード張り 3階内装軽量鉄骨 外部足場解体 金物取付
- ・計量棟：外壁ALC取付 ・資源ごみ処理施設：外壁塗装、設備配線、プラント機器（陶器類ガラスくず搬送コンベヤ据付）
- ・市民持込棟：腰壁躯体構築、内部配管配線、外部足場組立
