

## 現在建築工事中です！！

2023(令和5)年11月から建築工事が始まりました。現在、建物を支えるための杭を埋め込む杭工事や建物の基礎をつくる土工事を行っています。2027(令和9)年1月の供用開始に向け、組合と二市が連携して整備を進めています。



## 工事進捗状況写真



< 令和4年12月末(工事着工前) >



< 令和6年3月末現在 >


### 掘削工(ごみピット部二次掘削)

ごみピット内の収容のためより地中深くまで掘削中です。



### 仮設工(クローラークレーン組立)

大きな重量物を運ぶために、クローラークレーンを組立てています。

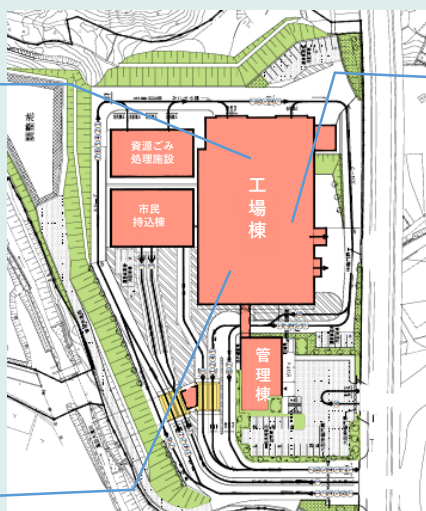

### 躯体工(炉室地下部CON打設)

建築物の主要な骨組みや構造を形成する工程です。



2022(令和4)年				2023(令和5)年				2024(令和6)年				2025(令和7)年				2026(令和8)年				2027年			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
				R5.1~11 造成設計																			
				R5.1~11 造成工事																			
								R5.11~R8.9 建築設計				R5.11~R8.9 建築工事											
												R7.1~R8.6 プラント設計				R7.1~R8.6 プラント工事							
																R8.2~8 外構工事							
																R8.7~12 試運転				R9.1 供用開始 ★			
